

西都市 橋梁・横断歩道橋長寿命化修繕計画
(個別施設計画)

公表資料



令和2年3月

西都市 建築課

目 次

1. 長寿命化修繕計画の目的	1
2. 長寿命化修繕計画の策定方針	3
2.1 西都市における橋梁メンテナンスサイクル	3
(1) 点検	4
(2) 診断	4
(3) 措置	4
(4) 記録	4
3. 個別施設計画（令和元年度末時点）	5
3.1 対象橋梁	5
3.2 計画期間	5
3.3 対策の優先順位の考え方	5
3.4 個別施設（橋梁）の状態等	6
3.5 対策内容と実施時期	1
3.6 対策費用	1
3.7 ライフサイクルコスト削減効果の確認	2

コツコツと着実に定期的な
点検、補修によるコスト削減！



表紙の橋梁：上の宮大橋（かみのみやおおばし）（1988年架設）

はじめに

西都市が管理する橋長 2m 以上の橋梁（370 橋）のうち、供用後 50 年以上経過している橋梁は 62 橋（約 17%）であります*が、このまま年数を経ますと 20 年後には 267 橋（約 72%）が高齢化することになります。

急増する高齢化橋梁に対し、損傷が深刻化してから大規模な修繕や架け替えの維持管理を行った場合、維持管理コストが一時期に集中し、財政状況を圧迫するだけでなく、適切な対応ができず、第三者への被害や地域住民の生活に影響を及ぼす可能性があります。

また、平成 26 年 7 月には、道路法改正に伴い橋梁全数の近接目視による点検を 5 年に 1 度の頻度で行い健全性の診断を行うなど、維持修繕に関するメンテナンスサイクルの実施が義務付けられました。これにより、西都市では平成 26 年度から近接目視による定期点検を開始し、点検の結果から各施設の状態を把握した上で、西都市では重大な損傷や致命的な損傷に至る前に予防的な補修を行い、健全な状態を維持することでライフサイクルコストの縮減を目的とした長寿命化修繕計画を策定しました。

本計画は近接目視による点検結果を踏まえ、従前の長寿命化修繕計画の見直しを行い、個別施設計画としてとりまとめを行ったものです。

※ 2020 年 3 月現在


1. 長寿命化修繕計画の目的

高齢化する道路橋の急速な増大に対応するため、従来の事後的な修繕および架替えから、予防的な修繕および計画的な架替えを実施し、構造物としての長寿命化を目的とした政策転換を行うとともに、事業費の平準化やライフサイクルコストの縮減を図ることを目的とします。

事後保全

- ・ 損傷が深刻化してはじめて大規模な修繕を実施
- ・ 橋の架け替えのサイクルも短い

コンクリートのひびわれが深刻



コンクリートの修繕




(特徴) 対策のタイミングを遅らせることで、短期的なコストは抑制されるが、損傷が深刻化すると対策工法が高度となり、ライフサイクルコストが大となる傾向があります。




予防保全

- ・ きちんと点検し、損傷が深刻化する前に修繕を実施
- ・ 橋の架け替えのサイクルも長くなる

点検により、コンクリートに軽微なひびわれを発見



下面に炭素繊維を接着することによりひびわれの進行を抑制



(特徴) こまめに手当することで、安全性を高水準で維持するとともに、長寿命化が期待できるため、ライフサイクルコストの低減が期待できる一方、短期的な対策コストが大となる傾向があります。

予防保全型の管理手法とすることによって、事後保全型、架け替え型よりもコストが小さくなります。また、橋の長寿命化も図れます。

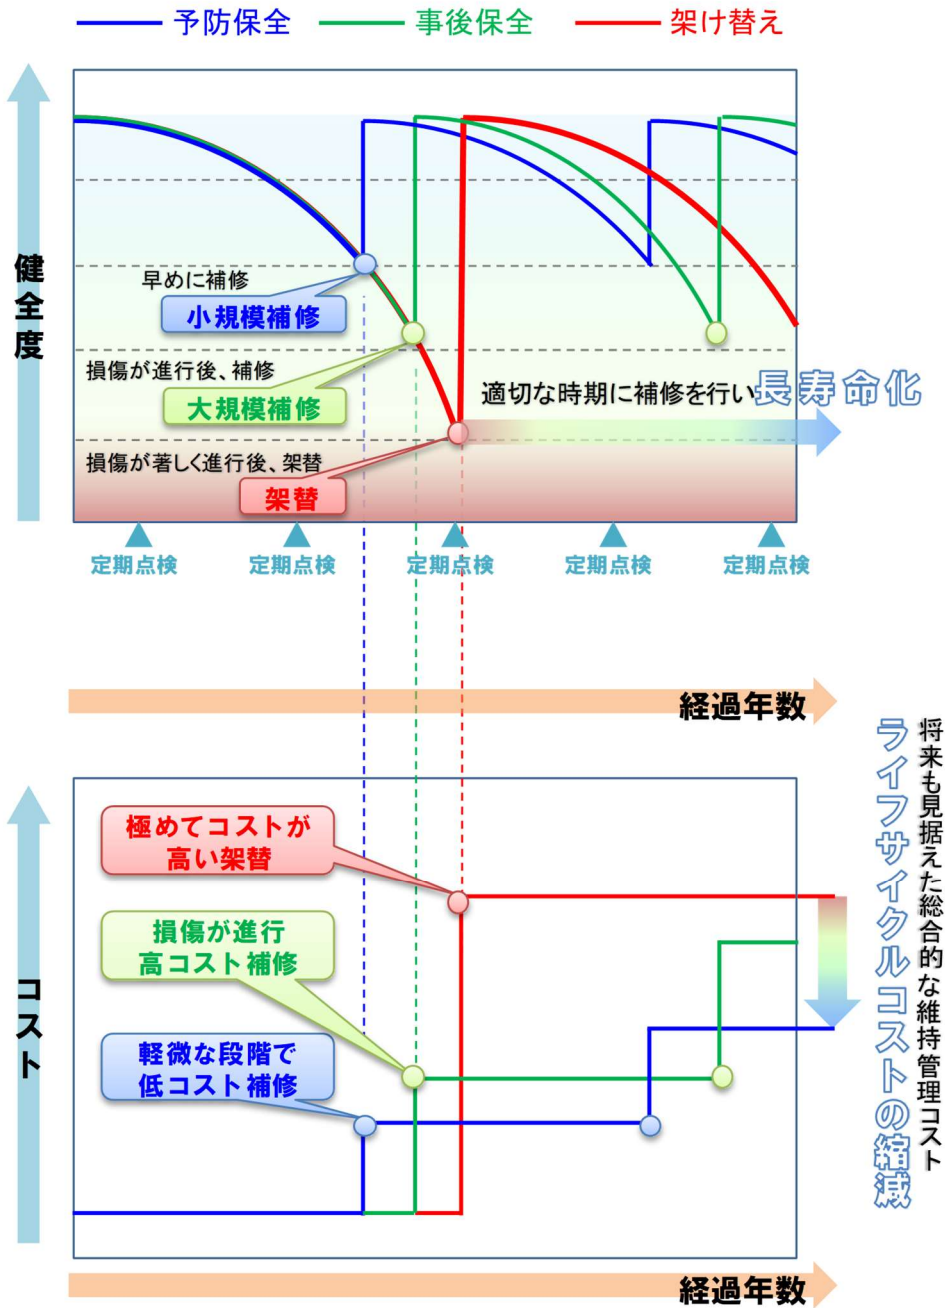


図 1 予防保全型管理手法による長寿命化とコスト縮減イメージ

2. 長寿命化修繕計画の策定方針

2.1 西都市における橋梁メンテナンスサイクル

道路の維持修繕に関する省令・告示の制定に伴い、点検、診断、措置、記録というメンテナンスサイクルへの取り組みが義務化されました。

今後は、メンテナンスサイクルを継続して回すことにより、橋梁の長寿命化ならびにコスト縮減が可能な橋梁マネジメントサイクルを構築し、将来にわたり適切な道路サービスの機能を維持することを基本とします。

橋梁は、利用状況、設置された自然環境等に応じ、劣化や損傷進行が施設ごとに異なり、その状態は時々刻々と変化します。このようなことから、修繕計画の策定に至っては、定期的な点検を実施し、基礎データとなる各橋梁の状態や損傷の程度から適切に評価・検討を行った上で、効果的な措置を講ずることが重要です。



図 2 メンテナンスサイクル

メンテナンスサイクルの各段階における具体的な取り組み等を次に解説します。

(1) 点検

橋梁は、利用状況、設置された自然環境等に応じ、劣化や損傷進行が施設ごとに異なり、その状態は時々刻々と変化します。現状では、これらの変化を正確に捉え、橋梁の寿命を精緻に評価することは技術的に困難なので、定期的な点検・診断により施設の状態を正確に把握することが重要です。

このため点検は、統一的な基準^{*1}により 5 年に 1 度近接目視による全数監視を実施することが義務付けられました。

(2) 診断

診断は、橋や部材の現在の状態に対して、次回の定期点検までの間（=5年程度以内を目途）に行うべき措置の必要性やその内容を、橋や部材の機能面に着目して判断するための一連の行為を診断と称しています。診断の結果については、国が定める統一的な尺度（4段階）で健全度の判定区分を分類することが義務付けられました。

(3) 措置

診断の結果、次回点検までの期間を目安として性能を回復するために必要な措置を行います。

措置の具体的な内容には、補修・補強工事や緊急対応、日常的な維持作業対応、詳細調査、経過観察などが挙げられます。必要な措置を講じることができない場合は通行規制・通行止めを行います。また必要に応じて、利用状況を踏まえ、橋梁等を集約化・撤去を検討します。

(4) 記録

点検・診断・措置の結果は、維持・補修計画を立案する上で基礎的な情報であり、適切な方法で記録し、随時、長寿命化修繕計画へ反映することで、計画と実施の乖離をなくします。



^{*1} 道路法施行令第 35 条の 2 第 2 項、道路法施行規則(昭和 27 年建設省令第 25 号)、トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示(平成 26 年国土交通省告示第 426 号)に従う定期点検

3. 個別施設計画（令和元年度末時点）

3.1 対象橋梁

令和元年度（2019）末時点で西都市が管理する橋梁数は、370 橋です。

3.2 計画期間

点検時期（5 年に 1 回）や修繕時期（点検結果に応じ）の見通しを立てるため、計画期間は 10 年とします。なお、定期点検結果や補修履歴を踏まえ、適宜、計画の更新を行います。

今回記載する計画の対象期間はそれぞれ次の通りです。

修繕計画年度 : 2020(R1)～2029

3.3 対策の優先順位の考え方

本計画期間内における各種措置の内、対策工事を行う橋梁について、橋の健全度と橋の重要度を加味した優先度評価値を用いて、対策の優先順位を評価します。

3.4 個別施設（橋梁）の状態等

平成 26 年度～令和元年度に定期点検を実施した橋梁において、

- ・ I（健全）が 292 橋（79%）
- ・ II（予防保全段階）が 72 橋（19%）
- ・ III（早期措置段階）が 6 橋（2%）
- ・ IV（緊急措置段階）が 0 橋（0%）

あることを把握しました。

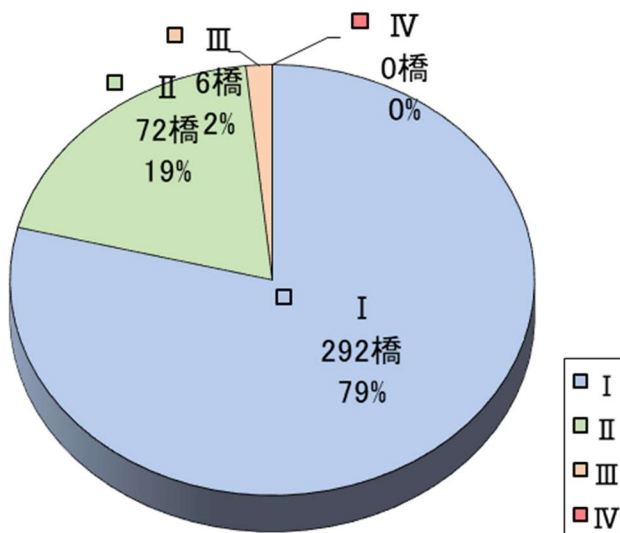


図 3 健全性の診断状況

健全度の区分		橋梁の状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

3.5 対策内容と実施時期

定期点検結果を踏まえ、次回の点検・診断や修繕・更新、さらには更新の機会を捉えた機能転換・用途変更、複合化、集約化、廃止・撤去、耐震化等の必要な対策について講じる措置の内容や実施時期を整理します。

なお、点検時期や対策時期は橋梁個別の状態によって変動するため、データ等の更新頻度は一定ではありませんが、少なくとも定期点検が実施された都度、それまでに実施された対策工事の実績等を踏まえ、長寿命化修繕計画の見直しを行います。

3.6 対策費用

部材や劣化原因、劣化状態に応じた補修対策工法と対策工法毎の補修単位を設定し、対策費用を算出します。

3.7 ライフサイクルコスト縮減効果の確認

評価期間 100 年とし、ライフサイクルコストを 2 通りシミュレーションした結果を図 4 に示します。

長寿命化修繕計画を策定する 370 橋について、今後 100 年間の事業費を比較すると、従来の事後保全型が 129 億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が 56 億円となり、コスト縮減効果は 73 億円となり、約 57%のコスト縮減効果が期待できます。

また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保されます。

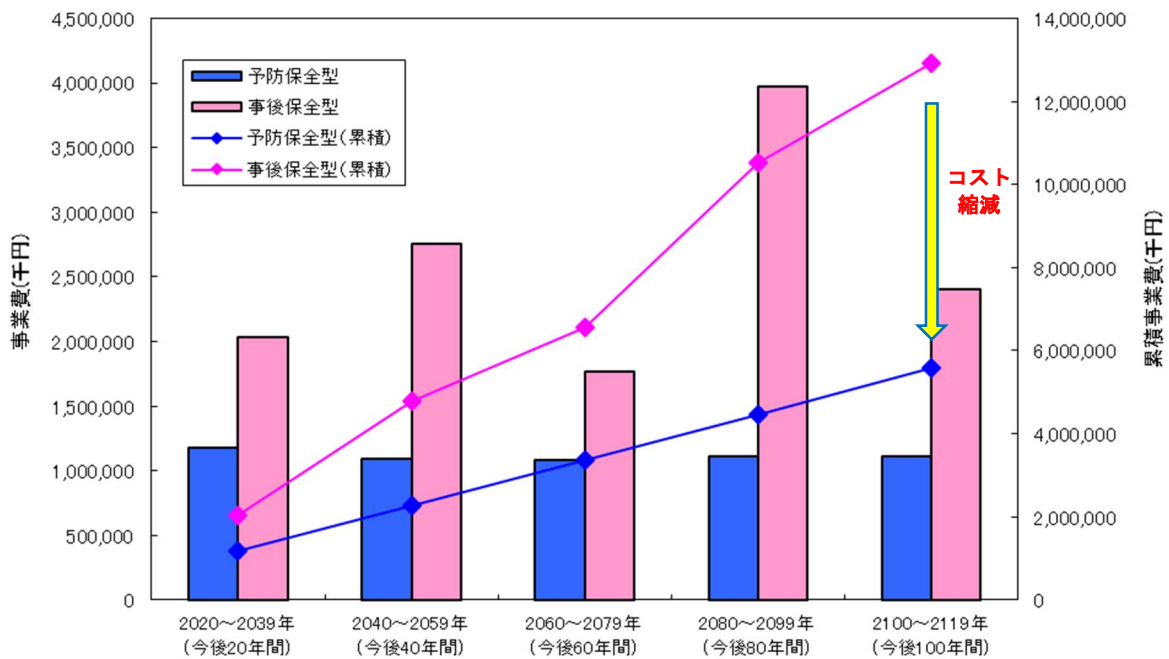


図 4 予防保全型の維持管理によるライフサイクルコストの縮減効果の試算結果

対策内容と実施時期および費用

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	※ 1 架 設 年	点 検 年	定期点検 結果	内 訳	事業費（千円）										
										対策内容・時期										
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	牛掛橋	困瀬川線	52	3.74	RC T桁	1964	2015	III	工種 工事(架替)委託(点検) 事業費	90,310	22,000	14,000	58,800		委託(点検) 323					
2	瓢丹淵橋	瓢丹淵樅木尾2号線	15.1	0.9	ラーメン橋	1988	2019	III	工種 委託(設計) 事業費	3,000	3,000			委託(点検) 272					委託(点検) 272	
3	彦三郎橋	茶屋元彦三郎線	8.8	3	RC T桁	1974	2019	III	工種 委託(設計) 事業費	3,000	1,500			委託(点検) 256		工事(床版,橋台) 1,500			委託(点検) 256	
4	上鶴橋	上鶴線	90	2.4	吊橋(その他)	1976	2019	III	工種 一部対策済 事業費					委託(点検)委託(設計) 3,868	工事(主部材) 13,551	工事(主部材) 13,279	工事(主部材) 4,809		委託(点検) 868	
5	現王屋敷橋	竹尾畑江線	25.5	4.7	I桁(合成)	1968	2015	II	工種 委託(点検) 事業費	310				委託(設計) 3,000	委託(点検)工事(点検,主部材,床版,支承,橋台) 13,850	工事(主部材,床版,支承,橋台) 13,278	工事(主部材,床版,支承,橋台) 5,748	工事(主部材,床版,支承,橋台) 7,816		
6	濁川橋	西都佐土原線	178	8	ポステンT桁	1968	2015	II	工種 一部対策済 委託(点検) 事業費	310					委託(点検) 562		委託(設計) 5,000	工事(主部材,横桁,支承,橋脚) 25,690	工事(主部材,横桁,支承,橋脚) 19,567	
7	上沖橋	高下奈良木線	13.6	4.3	H形鋼(不明)	1968	2017	II	工種 事業費			委託(点検) 270					委託(点検)委託(設計) 1,770	工事(床版,支承,橋台) 2,023		
8	困橋	困瀬川線	2.9	6	RC溝橋(BOXカルバート)	1968	2016	II	工種 事業費		委託(点検) 232					委託(点検) 232		工事() 5,000		
9	神倉谷川2号橋	河野口線	6.7	5.3	プレテン中空床版	1994	2016	II	工種 事業費		委託(点検) 263					委託(点検) 263		工事() 5,000		
10	赤野3号橋	赤野栗野線	7	5.9	RC床版橋(その他)	1989	2015	II	工種 委託(点検) 事業費	310					委託(点検) 257			工事() 5,000		
11	高野橋	高野線	20.3	3.7	H形鋼(不明)	1964	2016	II	工種 事業費		委託(点検) 345					委託(点検) 345		委託(設計) 3,000	工事(主部材,支承,橋台) 6,318	
12	前田下橋	平田松崎線	8.3	2.7	H形鋼(不明)	1968	2015	II	工種 委託(点検) 事業費	310					委託(点検) 235			委託(設計) 3,000	工事(主部材,床版,支承,橋台) 3,769	
13	下妻橋	高岸線	8.1	4.3	RC床版橋(その他)	1971	2015	II	工種 委託(点検) 事業費	310					委託(点検) 257			工事() 5,000		
14	桜川町3号橋	桜川町有吉町線	3.5	6.4	RC床版橋(その他)	1970	2015	II	工種 委託(点検) 事業費	310					委託(点検) 238			委託(設計) 3,000		
15	岩郷原橋	法乗田国富線	50	8.7	PC桁橋(その他)	1986	2019	II	工種 事業費					委託(点検) 520				委託(点検) 520		
16	黒坂1号橋	黒坂木城線	5.8	7.5	RC溝橋(BOXカルバート)	1980	2016	II	工種 事業費		委託(点検) 270					委託(点検) 270				
17	丸岡下1号線	丸岡下霜月田線	2.5	6.5	RC溝橋(BOXカルバート)	1987	2017	II	工種 事業費			委託(点検) 238					委託(点検) 238			
18	上中島1号橋	上中島市ヶ園線	2	5	RC溝橋(BOXカルバート)	1998	2015	II	工種 委託(点検) 事業費	310					委託(点検) 232					
19	金倉2号橋	金倉配ノ田線	2.9	4.8	RC溝橋(BOXカルバート)	1987	2016	II	工種 事業費		委託(点検) 238					委託(点検) 238				
20	金倉1号橋	金倉1号線	3.9	4.3	RC床版橋(その他)	1989	2017	II	工種 事業費			委託(点検) 227					委託(点検) 227			
21	宮ノ前橋	宮ノ前線	7.3	6.6	RC T桁	1998	2017	II	工種 事業費			委託(点検) 277					委託(点検) 277			
22	妻大橋	山角矢生町線	13	19	プレテン床版	1970	2015	II	工種 委託(点検) 事業費	310					委託(点検) 339					
23	黒坂2号橋	黒坂木城線	5.8	7.5	RC溝橋(BOXカルバート)	1980	2016	II	工種 事業費		委託(点検) 270					委託(点検) 270				
24	第2小戸口橋	平城小戸口線	20	2.6	H形鋼(不明)	1969	2016	II	工種 委託(点検) 事業費		委託(点検) 272					委託(点検) 272				

対策内容と実施時期および費用

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	※ 1 架 設 年	点 検 年	定期点検 結果	内 訳	事業費（千円）									
										対策内容・時期									
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
25	松田下橋	島廻竹尾尻線	29.4	3.2	H形鋼（不明）	1975	2015	II	工種 委託（点検） 事業費 300					委託（点検） 345					
26	中浦田橋	下九流水清水兼線	44.8	5.2	その他（PC橋）	2001	2015	II	工種 委託（点検） 事業費 300					委託（点検） 421					
27	新原橋	原田岩戸線	40.1	3.6	H形鋼（不明）	1965	2015	II	工種 委託（点検） 事業費 300					委託（点検） 369					
28	清水兼橋	下九流水清水兼線	41	5.2	その他（PC橋）	2000	2015	II	工種 委託（点検） 事業費 400					委託（点検） 421					
29	水喰入口橋	歩坂水喰線	8.3	4.8	H形鋼（非合成）	1975	2017	II	工種 委託（点検） 事業費		委託（点検） 257					委託（点検） 257			
30	旭橋	下鶴中央町線	12.5	6.8	プレテン床版	1971	2015	II	工種 委託（点検） 事業費 310					委託（点検） 288					
31	宮下橋	宮ノ後線	11.2	2.7	H形鋼（非合成）	1977	2016	II	工種 委託（点検） 事業費		委託（点検） 270				委託（点検） 270				
32	2号橋	平原6号線	21.5	4.8	H形鋼（不明）	1978	2016	II	工種 委託（点検） 事業費		委託（点検） 373				委託（点検） 373				
33	田野橋	田野土平線	13.5	2.5	H形鋼（非合成）	1990	2016	II	工種 委託（点検） 事業費		委託（点検） 257				委託（点検） 257				
34	小豆野跨道橋	歩坂谷川上線	22.5	7.2	PC桁橋（その他）	1992	2019	II	工種 委託（点検） 事業費				委託（点検） 393					委託（点検） 393	
35	北鶴2号橋	北鶴堀ノ内線	12.4	3.8	H形鋼（不明）	1984	2015	II	工種 委託（点検） 事業費 310					委託（点検） 257					
36	市の木浦橋	市ノ木浦2号線	18.1	2.8	I桁（不明）	1975	2019	II	工種 委託（点検） 一部対策済 事業費				委託（点検） 272					委託（点検） 272	
37	水神橋	下妻妻町線	11.6	8.9	プレテン床版	1973	2015	II	工種 委託（点検） 事業費 310					委託（点検） 288					
38	治校橋	大椎葉樑木線	17.5	2.6	ポステンT桁	1975	2016	II	工種 委託（点検） 事業費		委託（点検） 272				委託（点検） 272				
39	登内橋	茗荷原登内線	20.4	2.8	H形鋼（不明）	1973	2016	II	工種 委託（点検） 事業費		委託（点検） 345				委託（点検） 345				
40	石尾橋	石尾線	7	3.6	RC床版橋（その他）	1980	2016	II	工種 委託（点検） 事業費		委託（点検） 257				委託（点検） 257				
41	聖陵町橋	聖陵町御舟町線	6.4	6.9	RC溝橋（BOXカルバート）	1976	2015	II	工種 委託（点検） 事業費 310					委託（点検） 270					
42	杉山橋	西都佐土原線	5.5	10.2	RC床版橋（その他）	1962	2017	II	工種 委託（点検） 事業費			委託（点検） 283				委託（点検） 283			
43	桜川橋	高岸線	13.4	5.7	RC T桁	1956	2015	II	工種 委託（点検） 事業費 310					委託（点検） 271					
44	妻北小前歩道橋	西都佐土原線	10.5	1.9	I桁（非合成）	1963	2018	II	工種 委託（点検） 事業費			委託（点検） 292						委託（点検） 292	
45	聖陵町1号橋	聖陵町平田線	6.3	7	RC床版橋（その他）	1972	2015	II	工種 委託（点検） 事業費 310					委託（点検） 270					
46	山宮橋	山宮角地線	3.5	9	RC溝橋（BOXカルバート）	1967	2017	II	工種 委託（点検） 事業費			委託（点検） 238				委託（点検） 238			
47	高山橋	前田西前亀甲線	4.1	6.7	RC床版橋（その他）	1962	2017	II	工種 委託（点検） 事業費			委託（点検） 238				委託（点検） 238			
48	御舟町1号橋	御舟町桜川町2号線	3.6	6.9	RC床版橋（その他）	1970	2015	II	工種 委託（点検） 事業費 310					委託（点検） 238					

対策内容と実施時期および費用

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	※ 1 架 設 年	点 検 年	定期点検 結果	内 訳	事業費（千円）									
										対策内容・時期									
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
49	千畑潜水橋	千畑潜水橋線	142.1	3.1	プレテン床版	1972	2017	Ⅱ 一部対策済	工種 事業費			委託（点検） 511					委託（点検） 511		
50	新麓橋	吉田長谷線	37.6	6.8	プレテン床版	1978	2015	Ⅱ 一部対策済	工種 事業費	委託（点検） 300					委託（点検） 489				
51	小園2号橋	小園2号線	6	2.8	RC床版橋（その他）	2002	2017	Ⅱ	工種 事業費			委託（点検） 235					委託（点検） 235		
52	島廻2号橋	山角矢生町線	4.8	11.8	RC床版橋（その他）	1989	2015	Ⅱ	工種 事業費	委託（点検） 310					委託（点検） 260				
53	車瀬橋	調殿通線	18	16.8	ポステン中空床版	1993	2016	Ⅱ	工種 事業費		委託（点検） 371				委託（点検） 371				
54	丸岡下4号橋	丸岡下霜月田線	2.5	10.2	RC溝橋（BOXカルバート）	1984	2017	Ⅱ	工種 事業費			委託（点検） 238					委託（点検） 238		
55	三月田橋	三月田上ノ宮線	2.5	8	RC溝橋（BOXカルバート）	1984	2017	Ⅱ	工種 事業費			委託（点検） 238					委託（点検） 238		
56	平田2号橋	平田松崎線	3.8	2.9	RC床版橋（その他）	1984	2015	Ⅱ	工種 事業費	委託（点検） 310					委託（点検） 227				
57	石原3号橋	石原藤四郎窪線	6	4.1	RC床版橋（その他）	1998	2015	Ⅱ	工種 事業費	委託（点検） 310					委託（点検） 257				
58	三納新橋	中子田諸熊線	120	8.8	PC桁橋（その他）	1984	2019	Ⅱ 一部対策済	工種 事業費					委託（点検） 759					委託（点検） 759
59	下水流大橋	茶臼原西都原線	292	11.5	その他（PC橋）	1999	2019	Ⅱ	工種 事業費					委託（点検） 1,288					委託（点検） 1,288
60	水手洗橋	水手洗線	3.7	4.5	RC床版橋（その他）	1982	2017	Ⅱ	工種 事業費			委託（点検） 232					委託（点検） 232		
61	鶴田橋	鶴田中川原線	2.5	7.5	RC溝橋（BOXカルバート）	1984	2016	Ⅱ	工種 事業費		委託（点検） 238				委託（点検） 238				
62	丸岡下2号橋	丸岡下霜月田線	2.5	8.7	RC溝橋（BOXカルバート）	1990	2017	Ⅱ	工種 事業費			委託（点検） 238					委託（点検） 238		
63	公園通橋	公園通線	13.1	12.9	プレテン床版	1978	2015	Ⅱ	工種 事業費	委託（点検） 310					委託（点検） 307				
64	東明田1号橋	東明田島崎線	2	5	RC床版橋（その他）	1977	2017	Ⅱ	工種 事業費			委託（点検） 232					委託（点検） 232		
65	中山5号橋	中山小森線	2	5.8	RC溝橋（BOXカルバート）	1985	2017	Ⅱ	工種 事業費			委託（点検） 232					委託（点検） 232		
66	上の宮橋	加勢中神宮線	12.5	9.6	プレテン床版	1980	2017	Ⅱ	工種 事業費			委託（点検） 288					委託（点検） 288		
67	七夕田橋	七夕田伏ヶ迫線	3.9	3.4	RC床版橋（その他）	1999	2017	Ⅱ	工種 事業費			委託（点検） 227					委託（点検） 227		
68	童子丸橋	童子丸下線	5	3.4	RC床版橋（その他）	1997	2015	Ⅱ	工種 事業費	委託（点検） 310					委託（点検） 227				
69	柿内2号橋	柿内仲川原線	3.5	4	RC溝橋（BOXカルバート）	2003	2016	Ⅱ	工種 事業費		委託（点検） 227				委託（点検） 227				
70	大椎葉橋	麻畑大椎葉線	15	4.3	ラーメン橋	1960	2019	Ⅱ 一部対策済	工種 事業費					委託（点検） 271					委託（点検） 271
71	御舟橋	西都佐土原線	13.5	11.61	PC桁橋（その他）	1964	2015	Ⅱ 対策済	工種 事業費	委託（点検） 310					委託（点検） 310				
72	小向橋	長野1号線	22.4	3.2	I桁（不明）	1974	2019	I 対策済	工種 事業費					委託（点検） 278					委託（点検） 278

対策内容と実施時期および費用

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	※ 1 架 設 年	点 検 年	定期点検 結果	内 訳	事業費（千円）									
										対策内容・時期									
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
73	松清橋	尾筋西上松崎線	33.2	4	I 桁（不明）	1975	2015	II 対策済	工種 委託（点検） 事業費 310					委託（点検） 296					
74	高三納橋	鳶野笠原線	149.8	4.2	ポステンT桁	1965	2015	II 対策済	工種 委託（点検） 事業費 310					委託（点検） 444					
75	中長谷橋	吉田長谷線	21.9	4.6	H形鋼（不明）	1967	2015	II 対策済	工種 委託（点検） 事業費 310					委託（点検） 299					
76	朝喰橋	矢生町清水線	46	6.8	I 桁（不明）	1970	2019	I	工種 委託（点検） 事業費 499				委託（点検）						委託（点検） 499
77	向井町橋	中川原九流水中川原線	62.1	3.6	ポステンT桁	1965	2016	I	工種 委託（点検） 事業費 486					委託（点検） 486					
78	1号橋	平原6号線	33	4.8	H形鋼（不明）	1974	2016	I	工種 委託（点検） 事業費 421					委託（点検） 421					
79	小尻田橋	下島一位迫線	24.7	4.1	H形鋼（合成）	1971	2015	II 対策済	工種 委託（点検） 事業費 310					委託（点検） 299					
80	第1号橋	釘野内久野線	11.1	4	RC T桁	1962	2016	I	工種 委託（点検） 事業費 271					委託（点検） 271					
81	有吉橋	桜川町有吉町線	12.3	6.9	プレテン床版	1971	2015	I	工種 委託（点検） 事業費 310					委託（点検） 288					
82	千田潜水橋	調殿千田線	118.1	2.9	プレテン床版	1972	2015	I	工種 委託（点検） 事業費 400					委託（点検） 511					
83	井上1号橋	井上高三納線	13.2	3.8	I 桁（合成）	1983	2016	I	工種 委託（点検） 事業費 263					委託（点検） 263					
84	百人橋	西都佐土原線	6.3	12.4	RC T桁	1965	2016	I	工種 委託（点検） 事業費 283					委託（点検） 283					
85	岩井谷橋	山浦楠之木線	55.6	9.3	I 桁（不明）	1970	2016	I	工種 委託（点検） 事業費 558					委託（点検） 558					
86	七曲橋	惣太郎七曲1号線	26	4.8	H形鋼（不明）	1978	2015	I	工種 委託（点検） 事業費 400					委託（点検） 373					
87	岡下橋	岡下大町線	30	4.8	ポステンT桁	1978	2019	I	工種 委託（点検） 事業費 299				委託（点検）						委託（点検） 299
88	元山橋	歩坂水喰線	92.1	4.6	ポステンT桁	1973	2019	I	工種 委託（点検） 事業費 367				委託（点検）						委託（点検） 367
89	釘の原橋	岩下釘野原橋	16.5	4.3	PC桁橋（その他）	1965	2019	I	工種 委託（点検） 事業費 283				委託（点検）						委託（点検） 283
90	仁田脇橋	丸岡下霜月田線	38	7	プレテンT桁	1986	2016	I	工種 委託（点検） 事業費 489					委託（点検） 489					
91	桜川歩道橋	高鍋高岡線	46	2.4	I 桁（非合成）	1990	2018	I	工種 委託（点検） 事業費 328			委託（点検）							委託（点検） 328
92	平原橋	野竹内改線	33	5.8	プレテンT桁	1980	2016	I	工種 委託（点検） 事業費 421					委託（点検） 421					
93	猫島4号橋	猫島鶴後線	6.9	3.4	RC床版橋（その他）	1963	2017	I	工種 委託（点検） 事業費 235			委託（点検）				委託（点検）			235
94	岩井谷橋	法乗田国富線	52.4	8.7	PC桁橋（その他）	1996	2019	I	工種 委託（点検） 事業費 596				委託（点検）						委託（点検） 596
95	宮の谷橋	尾八重線	14.5	6.8	H形鋼（不明）	1976	2017	I	工種 委託（点検） 事業費 288			委託（点検）				委託（点検）			288
96	轟口小橋	立野下中川原線	16	6.9	RC床版橋（その他）	1963	2019	I	工種 委託（点検） 事業費 304				委託（点検）						委託（点検） 304

対策内容と実施時期および費用

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	※ 1 架 設 年	点 検 年	定期点検 結果	内 訳	事業費（千円）									
										対策内容・時期									
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
97	百年橋	竹尾久野線	6.2	4.4	RC床版橋（その他）	1969	2016	I	工種		委託（点検）				委託（点検）				
									事業費		257				257				
98	竹尾橋	竹尾久野線	2	4	RC床版橋（その他）	1972	2016	I	工種		委託（点検）				委託（点検）				
									事業費		227				227				
99	大迫橋	法瀬ヶ丸八反田線	18.8	4.8	H形鋼（不明）	1982	2015	I	工種	委託（点検）				委託（点検）					
									事業費	310					283				
100	水喰橋	牧堀水喰線	48.5	3.1	I桁（不明）	1977	2019	I	工種				委託（点検）						委託（点検）
									事業費				296						296
101	茗荷原橋	茗荷原登内線	18	3.1	H形鋼（不明）	1973	2016	I	工種		委託（点検）				委託（点検）				
									事業費		339				339				
102	松田大橋	鳥廻鏡田線	26.2	3.1	H形鋼（不明）	1970	2015	I	工種	委託（点検）				委託（点検）					
									事業費	400					345				
103	尾八重橋	尾八重線	14.3	4.4	H形鋼（不明）	1977	2016	I	工種		委託（点検）				委託（点検）				
									事業費		337				337				
104	下ノ畑橋	小鹿倉長園線	5.7	14	RC床版橋（その他）	1980	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費			284					284		
105	河の口橋	野地河野口1号線	17.5	3.8	I桁（不明）	1975	2019	I	工種				委託（点検）						委託（点検）
									事業費				272						272
106	桜川町4号橋	桜川町有吉町線	9	4.5	RC T桁	1956	2015	I	工種	委託（点検）				委託（点検）					
									事業費	310					263				
107	岩戸橋	下九流水清水兼線	16.5	4.2	PC桁橋（その他）	1966	2015	I	工種	委託（点検）				委託（点検）					
									事業費	310					283				
108	現王島大橋	現王島線	273	9.8	ボスTEN桁	2004	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費			961					961		
109	水神橋	竹尾久野線	5.5	4.1	RC床版橋（その他）	1975	2016	I	工種		委託（点検）				委託（点検）				
									事業費		257				257				
110	吉田1号橋	吉田国照寺線	5.1	3	RC床版橋（その他）	1970	2016	I	工種		委託（点検）				委託（点検）				
									事業費		235				235				
111	小戸口橋	竹尾畑江線	24	3.8	プレテン床版	1984	2016	I	工種		委託（点検）				委託（点検）				
									事業費		345				345				
112	大島潜水橋	山下城ヶ下線	54.4	3.1	プレテン床版	1963	2019	I	工種				委託（点検）						委託（点検）
									事業費				323						323
113	第2橋	雁亀向井町下川原線	13.2	5	H形鋼（非合成）	1981	2016	I	工種		委託（点検）				委託（点検）				
									事業費		270				270				
114	小坂元2号橋	小坂元戸屋ヶ前線	10.3	6	プレテン床版	1986	2016	I	工種		委託（点検）				委託（点検）				
									事業費		271				271				
115	小八重橋	尾八重線	12.6	5.2	プレテン床版	1986	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費			337					337		
116	下鶴4号橋	羽黒垣添車瀬線	12.4	4	H形鋼（不明）	1982	2015	I	工種	委託（点検）				委託（点検）					
									事業費	310					257				
117	島廻1号橋	島廻国分線	6	6.1	RC床版橋（その他）	1972	2015	I	工種	委託（点検）				委託（点検）					
									事業費	310					270				
118	平田3号橋	平田7号線	6.2	6.8	RC床版橋（その他）	1972	2015	I	工種	委託（点検）				委託（点検）					
									事業費	310					270				
119	御舟町3号橋	御舟町上妻線	11.6	4	プレテン床版	1970	2015	I	工種	委託（点検）				委託（点検）					
									事業費	310					257				
120	桜川町1号橋	桜川町聖陵町線	12	6.7	プレテン床版	1970	2015	I	工種	委託（点検）				委託（点検）					
									事業費	310					288				

対策内容と実施時期および費用

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	※ 1 架 設 年	点 検 年	定期点検 結果	内 訳	事業費（千円）									
										対策内容・時期									
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
121	加勢橋	深瀬田中線	25	6	ポステンT桁	1980	2016	I	工種		委託（点検）				委託（点検）				
									事業費		328				328				
122	園田橋	園田大知迫線	3	6.4	RC溝橋（BOXカルバート）	1967	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費		238						238		
123	北鶴5号橋	北鶴逆江本線	6	2.9	RC床版橋（その他）	1972	2015	I	工種	委託（点検）				委託（点検）					
									事業費	310				235					
124	笹ノ田橋	笹ノ田真竹平線	2	2.9	RC床版橋（その他）	1963	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		227					227			
125	立野3号橋	立野6号線	3.4	3.6	RC床版橋（その他）	1970	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		232					232			
126	猫島2号橋	猫島鶴後線	2.7	6.5	RC溝橋（BOXカルバート）	1974	2017	I	工種			委託（点検）						委託（点検）	
									事業費			238						238	
127	猫島3号橋	猫島鶴後線	2	7.7	RC溝橋（BOXカルバート）	1963	2017	I	工種			委託（点検）						委託（点検）	
									事業費			232						232	
128	三角田橋	三角田南牟田線	2	6.7	RC溝橋（BOXカルバート）	1963	2017	I	工種			委託（点検）						委託（点検）	
									事業費			238						238	
129	榎木瀬橋	榎木瀬立野線	33.7	7.9	RC床版橋（その他）	1963	2019	I	工種				委託（点検）						委託（点検）
									事業費				379						379
130	宮の下橋	宮園横山線	14.5	3.8	H形鋼（不明）	1973	2017	I	工種			委託（点検）						委託（点検）	
									事業費			257						257	
131	御舟町2号橋	御舟町桜川町2号線	12.8	7	プレテン床版	1970	2015	I	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費	310					288				
132	鳥子川久保橋	鳥子川久保線	136.5	3.6	ポステンT桁	1969	2019	I	工種				委託（点検）						委託（点検）
									事業費				392						392
133	瀬口橋	西都佐土原線	10.2	8.1	RC溝橋（BOXカルバート）	1998	2017	I	工種			委託（点検）						委託（点検）	
									事業費			288						288	
134	再生橋	クリーンセンター通線	19	12.2	プレテン床版	2003	2017	I	工種			委託（点検）						委託（点検）	
									事業費			398						398	
135	中園橋	中園線	6.1	3.6	RC床版橋（その他）	1990	2017	I	工種			委託（点検）						委託（点検）	
									事業費			235						235	
136	月中橋	月中原中線	5.9	4.6	RC床版橋（その他）	1965	2017	I	工種			委託（点検）						委託（点検）	
									事業費			257						257	
137	前原橋	前原亀塚線	5.6	5	RC溝橋（BOXカルバート）	1974	2017	I	工種			委託（点検）						委託（点検）	
									事業費			257						257	
138	後川内橋	内田線	22.6	4	H形鋼（非合成）	1983	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		373					373			
139	松本1号橋	松本宮の下線	16.5	5	プレテンT桁	1986	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		283					283			
140	馬場田橋	馬場田線	4.5	3.7	RC溝橋（BOXカルバート）	1967	2017	I	工種			委託（点検）						委託（点検）	
									事業費			227						227	
141	前田2号橋	下三財前田2号線	4.6	3	RC床版橋（その他）	1963	2017	I	工種			委託（点検）						委託（点検）	
									事業費			227						227	
142	前田1号橋	下三財前田1号線	2.8	7.3	RC溝橋（BOXカルバート）	1963	2017	I	工種			委託（点検）						委託（点検）	
									事業費			238						238	
143	池平1号橋	池平長田線	6.6	7.1	RC床版橋（その他）	1975	2015	I	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費	310					270				
144	立野2号橋	立野3号線	3.3	2.4	RC溝橋（BOXカルバート）	1970	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		227					227			

対策内容と実施時期および費用

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	※ 1 架 設 年	点 検 年	定期点検 結果	内 訳	事業費（千円）									
										対策内容・時期									
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
145	西田橋	西田卯の木線	3	3.1	RC床版橋（その他）	1970	2016	I	工種		委託（点検）				委託（点検）				
									事業費		227				227				
146	池平2号橋	池平長田線	4.3	6.2	RC床版橋（その他）	1975	2015	I	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費	310					238				
147	水口ヶ迫2号橋	水口ヶ迫1号線	5.3	3.4	RC床版橋（その他）	1988	2017	I	工種			委託（点検）						委託（点検）	
									事業費			235						235	
148	金倉橋	金倉配ノ田線	91.8	5	ポステンT桁	1988	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		622					622			
149	吉原橋	吉原原無田線	6.4	6.6	ブレン中空床版	1979	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		277					277			
150	友愛橋	東原小浪線	8.8	5.7	ブレン中空床版	1980	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		330					330			
151	真菅崎橋	真萱ヶ崎線	10.3	5	ブレン床版	1986	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		271					271			
152	山城橋	宇戸仲鶴3号線	8.5	8	ブレン床版	1979	2017	I	工種			委託（点検）						委託（点検）	
									事業費			277						277	
153	梯子橋	向山線	33	2.7	H形鋼（不明）	1994	2017	I	工種			委託（点検）						委託（点検）	
									事業費			369						369	
154	野地橋	西都原清水台線	24.5	4.8	H形鋼（不明）	1979	2015	I	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費	400					373				
155	中入橋	戸崎1号線	14.6	4.2	RC T桁	1978	2017	I	工種			委託（点検）						委託（点検）	
									事業費			271						271	
156	湯之内吊橋	片内1号線	85.7	3	吊橋（その他）	2007	2019	I	工種					委託（点検）					委託（点検）
									事業費					992					992
157	札立4号橋	札立上寺迫線	6.2	3.5	RC床版橋（その他）	1981	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		235					235			
158	札立5号橋	札立上寺迫線	6.2	3	RC床版橋（その他）	1976	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		235					235			
159	片内6号橋	片内2号線	2.5	4	RC床版橋（その他）	1978	2017	I	工種			委託（点検）						委託（点検）	
									事業費			227						227	
160	片内2号橋	片内1号線	8	1.3	その他（木橋）	1978	2017	I	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費	310					256				
161	片内3号橋	片内1号線	5	1.3	その他（木橋）	1978	2017	I	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費	310					243				
162	片内4号橋	片内1号線	5	2.5	その他（木橋）	1980	2017	I	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費	310					243				
163	観音橋	尾田所線	24.6	5.5	ポステン中空床版	2006	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		421					421			
164	諏訪下橋	金倉井手下線	89.4	5	ポステンT桁	1992	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		622					622			
165	桑原2号橋	桑原寺ノ馬場線	9.4	3.4	RC T桁	1968	2015	III 対策済	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費	310					256				
166	宮の下1号橋	宮の下線	3	3	RC床版橋（その他）	1965	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		227					227			
167	春日橋	一之迫線	5.3	4	RC床版橋（その他）	2000	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		257					257			
168	黒松ノ元1号橋	黒松元黒松線	2	3.7	RC溝橋（BOXカルバート）	1975	2017	I	工種			委託（点検）						委託（点検）	
									事業費			227						227	

対策内容と実施時期および費用

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	※ 1 架 設 年	点 検 年	定期点検 結果	内 訳	事業費（千円）									
										対策内容・時期									
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
169	前田3号橋	前田岩崎線	2.2	4.4	RC溝橋（BOXカルバート）	1963	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費			232					232		
170	前田・高山橋	前田・高山線	2.8	6	RC溝橋（BOXカルバート）	1963	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費			232					232		
171	川久保橋	獅子堀川久保線	32.4	4.8	プレテン床版	1992	2015	I	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費	400					421				
172	丸岡下橋	丸岡下元山線	5.3	4.4	RC床版橋（その他）	1975	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費			257					257		
173	山内橋	山内線	2.8	3	RC床版橋（その他）	1972	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		227					227			
174	宇戸1号橋	宇戸山内線	3	4.5	RC床版橋（その他）	1972	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		232					232			
175	元山1号橋	元山栈敷野線	3.5	5.5	RC溝橋（BOXカルバート）	1975	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費			232					232		
176	岡下1号橋	岡下大町線	3.3	6	RC溝橋（BOXカルバート）	1974	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費			232					232		
177	桜川町2号橋	桜川町聖陵町線	3.5	6	RC床版橋（その他）	1971	2015	I	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費	310					232				
178	加勢下橋	南園父ヶ迫線	16.8	3.8	プレテンT桁	1983	2019	I	工種					委託（点検）					委託（点検）
									事業費					272					272
179	妙見橋	高野線	21.1	3.8	H形鋼（不明）	1979	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		345					345			
180	後迫橋	八反田後迫線	17.2	4	H形鋼（不明）	1979	2015	I	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費	310					272				
181	尾八重2号橋	尾八重線	17	4.1	RC床版橋（その他）	1984	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		283					283			
182	錦竹橋	平下小浪線	8.8	5.6	プレテン中空床版	1980	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		330					330			
183	太鼓橋	春日小浪線	8.8	5.6	プレテン中空床版	1980	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		330					330			
184	丸岡下3号橋	丸岡下霜月田線	13.4	6	プレテン床版	1980	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		288					288			
185	笠原1号橋	笠原2号線	13.5	5	プレテン床版	1984	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		271					271			
186	茗荷原1号橋	茗荷原登内線	11.6	4	RC溝橋（BOXカルバート）	1981	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費			257					257		
187	上向井町橋	上向井町九流下川原線	13.2	6	プレテン床版	1981	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費			271					271		
188	石野田馬橋	外園長割線	9.2	5.8	プレテン床版	1985	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費			263					263		
189	小崎橋	小崎戸崎線	5	3.1	RC床版橋（その他）	1977	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費			227					227		
190	戸崎2号橋	戸崎1号線	6.1	3.4	RC床版橋（その他）	1977	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費			235					235		
191	戸崎1号橋	戸崎1号線	5.4	4	RC床版橋（その他）	1978	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費			235					235		
192	石野田橋	外園中須線	11.4	5.8	プレテン床版	1981	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費			271					271		

対策内容と実施時期および費用

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	※ 1 架 設 年	点 検 年	定期点検 結果	内 訳	事業費（千円）								
										対策内容・時期								
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
193	井尻1号橋	井尻猫島線	5	3.5	RC床版橋（その他）	1985	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 227					委託（点検） 227	
194	六田橋	六田仁田脇線	13.4	4.8	プレテン床版	1981	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 271					委託（点検） 271	
195	川上橋	上ノ宮1号線	11.8	4	プレテン床版	1985	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 263					委託（点検） 263	
196	尾八重3号橋	尾八重線	13.1	4.1	RC床版橋（その他）	1985	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 337					委託（点検） 337	
197	下妻新橋	下妻上町線	12.9	16.9	プレテン床版	1973	2015	I	工種 事業費	委託（点検） 310					委託（点検） 324			
198	清水橋	都於郡線	146.4	7.2	ポステンT桁	1968	2019	I	工種 事業費				委託（点検） 994					委託（点検） 994
199	下中島橋	下中島九樹園線	3	8	RC溝橋（BOXカルバート）	1994	2015	I	工種 事業費	委託（点検） 310					委託（点検） 238			
200	法瀬ヶ丸橋	法瀬ヶ丸八反田線	3.5	3.1	RC溝橋（BOXカルバート）	1981	2015	I	工種 事業費	委託（点検） 310					委託（点検） 227			
201	上ー之迫橋	茶臼原西都原線	61.1	11.1	PC 床版橋その他	2000	2019	I	工種 事業費				委託（点検） 682					委託（点検） 682
202	上の宮大橋	加勢中神宮線	142.9	9.8	PC桁橋（その他）	1988	2019	I	工種 事業費				委託（点検） 759					委託（点検） 759
203	前田橋	三財都於郡線	31	6	ポステンT桁	1976	2015	II 対策済	工種 事業費	委託（点検） 310					委託（点検） 328			
204	茶緑ヶ迫橋	茶緑ヶ迫水口ヶ迫線	5.9	3.4	RC床版橋（その他）	2001	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 235					委託（点検） 235	
205	御手洗橋	戸敷線	10.3	6.7	プレテン床版	1984	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 288					委託（点検） 288	
206	筑後2号橋	筑後上原線	4.8	4	RC床版橋（その他）	2001	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 227					委託（点検） 227	
207	永代橋	吉田長谷線	41.7	4.6	RC T桁	1964	2019	I	工種 事業費				委託（点検） 421					委託（点検） 421
208	三納小学校橋	三納小学校前通線	3.2	3.8	RC床版橋（その他）	1978	2016	I	工種 事業費		委託（点検） 232					委託（点検） 232		
209	瀬志子橋	瀬志子線	2.5	4.9	RC溝橋（BOXカルバート）	1976	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 232					委託（点検） 232	
210	井尻2号橋	井尻猫島線	4.3	5.7	RC溝橋（BOXカルバート）	1985	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 232					委託（点検） 232	
211	高町橋	高町藤栄線	3	6	RC溝橋（BOXカルバート）	1985	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 232					委託（点検） 232	
212	赤道橋	赤道春田線	4.7	4.4	RC床版橋（その他）	1995	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 232					委託（点検） 232	
213	城ヶ下1号橋	枯木ヶ廻園田線	4	3.5	RC床版橋（その他）	1978	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 227					委託（点検） 227	
214	臼坪橋	臼坪青木線	2	4.3	RC溝橋（BOXカルバート）	1984	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 232					委託（点検） 232	
215	別府代2号橋	別府代菰田線	2.4	8.3	RC溝橋（BOXカルバート）	1985	2016	I	工種 事業費		委託（点検） 238						委託（点検） 238	
216	別府代1号橋	別府代菰田線	2.4	9	RC溝橋（BOXカルバート）	1985	2016	I	工種 事業費		委託（点検） 238						委託（点検） 238	

対策内容と実施時期および費用

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	※ 1 架 設 年	点 検 年	定期点検 結果	内 訳	事業費（千円）									
										対策内容・時期									
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
217	原田橋	原田榎野線	2.5	9	RC溝橋（BOXカルバート）	1986	2016	I	工種 事業費		委託（点検） 238				委託（点検） 238				
218	高下橋	高下奈良木線	2.1	3	RC溝橋（BOXカルバート）	1976	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 227					委託（点検） 227		
219	鶴田1号橋	鶴田深長線	2	9	RC溝橋（BOXカルバート）	1981	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 238						委託（点検） 238	
220	門田下1号橋	門田下古川線	2	10	RC溝橋（BOXカルバート）	1987	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 238						委託（点検） 238	
221	原園橋	原園金倉線	2.6	5	RC溝橋（BOXカルバート）	1989	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 232						委託（点検） 232	
222	猫島1号橋	猫島鶴後線	2	4.9	RC溝橋（BOXカルバート）	1977	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 232						委託（点検） 232	
223	向園1号橋	向園臼坪線	3.3	3.9	RC床版橋（その他）	1985	2015	I	工種 事業費	委託（点検） 310					委託（点検） 227				
224	別府原橋	都於郡佐土原線	81.1	8	ラーメン橋	1998	2019	I	工種 事業費					委託（点検） 855					委託（点検） 855
225	赤星橋	赤星ハケ久保線	5.5	3	RC床版橋（その他）	1998	2016	I	工種 事業費		委託（点検） 235				委託（点検） 235				
226	観音橋1	春田線	3.5	6.7	RC床版橋（その他）	1999	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 232						委託（点検） 232	
227	山口橋	法乗田財谷線	4.5	4.6	PC 床版橋その他	1984	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 251						委託（点検） 251	
228	城ヶ下2号橋	枯木ヶ廻園田線	4.6	4	RC床版橋（その他）	1980	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 232						委託（点検） 232	
229	屋敷田橋	屋敷田前田線	2	6	RC溝橋（BOXカルバート）	1978	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 232						委託（点検） 232	
230	深瀬1号橋	深瀬田中線	2	5.4	RC溝橋（BOXカルバート）	1979	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 232						委託（点検） 232	
231	岡下2号橋	岡下大町線	2	6	RC溝橋（BOXカルバート）	1986	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 232						委託（点検） 232	
232	内田橋	内田線	2.5	5.1	RC溝橋（BOXカルバート）	1976	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 232						委託（点検） 232	
233	町頭2号橋	上町仲川原線	2.5	7	RC溝橋（BOXカルバート）	1981	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 238						委託（点検） 238	
234	筑後潜水橋	四日市筑後線	45.6	2.5	プレテン床版	1957	2016	I	工種 事業費		委託（点検） 296					委託（点検） 296			
235	川南1号橋	三財都於郡線	11.2	2.7	プレテン床版	1980	2016	I	工種 事業費		委託（点検） 277					委託（点検） 277			
236	中子田1号橋	中子田諸熊線	12.7	8.2	プレテン床版	1985	2016	I	工種 事業費		委託（点検） 288					委託（点検） 288			
237	自歩道3号橋	妻川仲島公園通線	2.9	3.4	RC床版橋（その他）	2002	2016	I	工種 事業費		委託（点検） 227					委託（点検） 227			
238	自歩道4号橋	妻川仲島公園通線	2.8	3.4	RC床版橋（その他）	2003	2016	I	工種 事業費		委託（点検） 227					委託（点検） 227			
239	西平田3号橋	西平田鋒田線	3.1	2.4	RC床版橋（その他）	2002	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 227						委託（点検） 227	
240	下高野橋	下高野土器田線	5	5	RC床版橋（その他）	1978	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 232						委託（点検） 232	

対策内容と実施時期および費用

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	※ 1 架 設 年	点 検 年	定期点検 結果	内 訳	事業費（千円）									
										対策内容・時期									
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
241	北鶴6号橋	北鶴西屋敷線	2	9.7	RC溝橋（BOXカルバート）	1994	2015	I	工種 委託（点検） 事業費 310					委託（点検） 238					
242	別府代3号橋	別府代菰田線	2.4	7.5	RC溝橋（BOXカルバート）	1985	2016	I	工種 委託（点検） 事業費 261						委託（点検） 261				
243	野竹橋	野竹平原線	4.8	3.5	RC床版橋（その他）	1978	2016	I	工種 委託（点検） 事業費 227						委託（点検） 227				
244	鶴田2号橋	鶴田深長線	2.8	8	RC溝橋（BOXカルバート）	1979	2017	I	工種 委託（点検） 事業費 238							委託（点検） 238			
245	井尻3号橋	井尻猫島線	2	9.1	RC溝橋（BOXカルバート）	1985	2017	I	工種 委託（点検） 事業費 238							委託（点検） 238			
246	藤栄橋	藤栄上鶴線	2	7	RC溝橋（BOXカルバート）	1985	2017	I	工種 委託（点検） 事業費 238							委託（点検） 238			
247	北水戸橋	北水戸門下線	3	4	RC床版橋（その他）	1987	2017	I	工種 委託（点検） 事業費 227							委託（点検） 227			
248	明ノ前橋	明ノ前西ノ前線	3	4.3	RC床版橋（その他）	1990	2017	I	工種 委託（点検） 事業費 232							委託（点検） 232			
249	藤四郎窪橋	藤四郎窪中島線	2	7	RC溝橋（BOXカルバート）	1995	2015	I	工種 委託（点検） 事業費 310					委託（点検） 238					
250	平田1号橋	平田松崎線	3	2.8	RC床版橋（その他）	1983	2015	I	工種 委託（点検） 事業費 310						委託（点検） 227				
251	水口ヶ迫3号橋	水口ヶ迫2号線	5.2	3.4	RC床版橋（その他）	2001	2017	I	工種 委託（点検） 事業費 235							委託（点検） 235			
252	水口ヶ迫1号橋	水口ヶ迫1号線	5.1	3.4	RC床版橋（その他）	2001	2017	I	工種 委託（点検） 事業費 235							委託（点検） 235			
253	石原5号橋	石原藤四郎窪線	15.6	5.7	プレテン床版	1998	2017	I	工種 委託（点検） 事業費 283							委託（点検） 283			
254	佐現橋	現王島線	21	13	プレテン床版	2002	2017	I	工種 委託（点検） 事業費 376							委託（点検） 376			
255	札立橋	北鶴尾筋東下線	18.7	7.7	プレテン床版	2000	2015	I	工種 委託（点検） 事業費 400						委託（点検） 390				
256	滝ノ下4号橋	滝ノ下彦田線	4.5	4.8	RC溝橋（BOXカルバート）	1963	2017	I	工種 委託（点検） 事業費 238							委託（点検） 238			
257	滝ノ下3号橋	滝ノ下彦田線	3.9	5.2	RC溝橋（BOXカルバート）	1963	2017	I	工種 委託（点検） 事業費 232							委託（点検） 232			
258	滝ノ下2号橋	滝ノ下彦田線	2.6	5.6	RC溝橋（BOXカルバート）	1963	2017	I	工種 委託（点検） 事業費 232							委託（点検） 232			
259	無名橋2	逢初川歩行者専用道路線	25.4	2.75	その他（木橋）	2011	2017	I	工種 委託（点検） 事業費 278							委託（点検） 278			
260	丸山橋	獅子堀川久保線	11.2	2.7	ポステン中空床版	2005	2016	I	工種 委託（点検） 事業費 328						委託（点検） 328				
261	坂平橋	城平黒坂線	5.2	5.5	RC床版橋（その他）	1996	2016	I	工種 委託（点検） 事業費 257						委託（点検） 257				
262	原無田2号橋	原無田5号線	5.6	5.6	RC床版橋（その他）	2010	2016	I	工種 委託（点検） 事業費 257						委託（点検） 257				
263	毘沙門橋	川添松崎線	10	7.4	プレテン床版	1997	2017	I	工種 委託（点検） 事業費 277							委託（点検） 277			
264	水洗橋	馬場崎田前線	5.5	5.6	RC床版橋（その他）	2007	2015	I	工種 委託（点検） 事業費 310					委託（点検） 257					

対策内容と実施時期および費用

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	※ 1 架 設 年	点 検 年	定期点検 結果	内 訳	事業費（千円）									
										対策内容・時期									
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
265	調殿2号橋	調殿千田線	4.8	4.1	RC床版橋（その他）	2010	2015	I	工種 委託（点検） 事業費 310					委託（点検） 232					
266	無名橋3	逢初川歩行者専用道路線	5.8	2.75	H形鋼（不明）	2011	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 235				委託（点検） 235			
267	原無田2号橋	原無田線	6.8	7	プレテン床版	1978	2016	I	工種 委託（点検） 事業費						委託（点検） 277				
268	無名橋4	逢初川歩行者専用道路線	2.2	2.5	その他（木橋）	2011	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 243					委託（点検） 243		
269	自歩道2号橋	妻川仲島公園通線	2.2	3.4	RC床版橋（その他）	2003	2016	I	工種 委託（点検） 事業費						委託（点検） 227				
270	西平田4号橋	西平田鋒田線	3.4	3.5	RC床版橋（その他）	2002	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 227					委託（点検） 227		
271	赤野2号橋	赤野栗野線	2	6.6	RC溝橋（BOXカルバート）	2009	2015	I	工種 委託（点検） 事業費 310						委託（点検） 238				
272	池平4号橋	北鶴尾筋東下線	2	8	RC溝橋（BOXカルバート）	2009	2015	I	工種 委託（点検） 事業費 310						委託（点検） 238				
273	鏡心畑1号橋	鏡心畑寺ノ下線	2	4.3	RC溝橋（BOXカルバート）	1999	2015	I	工種 委託（点検） 事業費 310						委託（点検） 232				
274	朝倉橋	御舟塚高取線	10.6	7.9	RC T桁	1972	2015	I	工種 委託（点検） 事業費 400						委託（点検） 356				
275	川南3号橋	三財都於郡線	3	11	RC溝橋（BOXカルバート）	1985	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 260					委託（点検） 260		
276	中山6号橋	中山小森線	2	13.5	RC溝橋（BOXカルバート）	1985	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 260					委託（点検） 260		
277	麓橋	吉田長谷線	3.7	5.2	RC床版橋（その他）	1999	2016	I	工種 委託（点検） 事業費						委託（点検） 232				
278	鳶野3号橋	鳶野笠原線	15.6	4	プレテン中空床版	1985	2016	I	工種 委託（点検） 事業費						委託（点検） 283				
279	第二七曲橋	西都原総合台線	23.4	6.2	プレテンT桁	1992	2015	I	工種 委託（点検） 事業費 400						委託（点検） 421				
280	中山4号橋	中山小森線	4	4.4	RC床版橋（その他）	2000	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 232					委託（点検） 232		
281	中山3号橋	中山小森線	4.7	4.5	RC溝橋（BOXカルバート）	2000	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 232					委託（点検） 232		
282	岩爪橋	岩爪長園線	7.8	5.8	RC床版橋（その他）	1982	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 257					委託（点検） 257		
283	上妻橋	神社前通線	13	12.8	プレテン床版	1987	2015	I	工種 委託（点検） 事業費 310						委託（点検） 307				
284	平下橋	黒坂木城線	7.5	8.3	プレテン中空床版	1980	2016	I	工種 委託（点検） 事業費						委託（点検） 344				
285	瀬口1号橋	瀬口鳥子線	5.3	15	RC溝橋（BOXカルバート）	1998	2015	I	工種 委託（点検） 事業費 310						委託（点検） 296				
286	町頭5号橋	町頭下水流線	3.7	18	RC溝橋（BOXカルバート）	1999	2015	I	工種 委託（点検） 事業費 310						委託（点検） 268				
287	中子田2号橋	中子田諸熊線	6.8	7.1	プレテン床版	1980	2016	I	工種 委託（点検） 事業費						委託（点検） 277				
288	宝財原橋	宝財原線	3.9	3.6	RC溝橋（BOXカルバート）	1976	2016	I	工種 委託（点検） 事業費						委託（点検） 238				

対策内容と実施時期および費用

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	※ 1 架 設 年	点 検 年	定期点検 結果	内 訳	事業費（千円）									
										対策内容・時期									
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
289	平郡橋	石廻広見廻2号線	3.2	3.5	RC床版橋（その他）	1986	2016	I	工種 事業費		委託（点検） 227				委託（点検） 227				
290	札立2号橋	札立線	2	4	RC床版橋（その他）	1981	2016	I	工種 事業費		委託（点検） 232				委託（点検） 232				
291	札立3号橋	札立長谷場線	2	9	RC床版橋（その他）	1981	2016	I	工種 事業費		委託（点検） 238				委託（点検） 238				
292	土屋1号橋	土屋線	4.9	3.5	RC床版橋（その他）	1981	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 227					委託（点検） 227		
293	土屋2号橋	土屋線	3.9	2.9	RC床版橋（その他）	1981	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 227					委託（点検） 227		
294	古野2号橋	古野線	3.4	4	RC床版橋（その他）	1976	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 227					委託（点検） 227		
295	古野1号橋	古野線	2	3.3	RC床版橋（その他）	1976	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 227					委託（点検） 227		
296	黒松ノ元2号橋	黒松元黒松線	4	3.7	RC床版橋（その他）	1985	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 227					委託（点検） 227		
297	鶯野3号橋1	臼坪湯牟田線	3.4	6	RC溝橋（BOXカルバート）	1986	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 232					委託（点検） 232		
298	畑橋	畑和泉ヶ迫線	3.2	3.3	RC床版橋（その他）	1987	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 227					委託（点検） 227		
299	尾八重4号橋	尾八重線	2	3.6	RC溝橋（BOXカルバート）	1977	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 227					委託（点検） 227		
300	土ノ口橋2	土ノ口蔵之向2号線	2	8	RC溝橋（BOXカルバート）	1993	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 238					委託（点検） 238		
301	勿田3号橋	勿田平田線	4.9	3.4	RC床版橋（その他）	1988	2015	I	工種 事業費	委託（点検） 310					委託（点検） 227				
302	山路橋	中子田諸熊線	11.4	8.2	プレテン床版	1988	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 288					委託（点検） 288		
303	筑後橋	筑後線	15.9	8.2	プレテン床版	2002	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 304					委託（点検） 304		
304	川久保橋2	鳥子川久保線	15	6.2	プレテン床版	2002	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 356					委託（点検） 356		
305	長仙橋	長仙坂江線	11	5	プレテン床版	1993	2016	I	工種 事業費		委託（点検） 288				委託（点検） 288				
306	町ノ前1号橋	町ノ前伊左工門線	6.4	5	プレテン床版	1984	2016	I	工種 事業費		委託（点検） 263				委託（点検） 263				
307	下鶴1号橋	下鶴川原線	9.3	4.8	プレテン床版	1976	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 263					委託（点検） 263		
308	深瀬2号橋	深瀬田中線	5.2	5.8	プレテン床版	1979	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 263					委託（点検） 263		
309	井添橋	井添外園線	5.3	2.4	RC床版橋（その他）	1978	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 235					委託（点検） 235		
310	馬場崎橋	馬場崎線	5.9	3.1	RC床版橋（その他）	1980	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 235					委託（点検） 235		
311	永代橋2	瀬口2号線	7	3.4	RC床版橋（その他）	1987	2017	I	工種 事業費			委託（点検） 235					委託（点検） 235		
312	田野表橋	田野線	20.5	4	I桁（非合成）	1993	2016	I	工種 事業費		委託（点検） 299				委託（点検） 299				

対策内容と実施時期および費用

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	※ 1 架 設 年	点 検 年	定期点検 結果	内 訳	事業費（千円）										
										対策内容・時期										
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
313	上野1号橋	上野原無田線	2.6	9.5	RC溝橋（BOXカルバート）	1979	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）				
									事業費		238					238				
314	上野2号橋	仮屋原原無田線	3.1	7	RC溝橋（BOXカルバート）	1979	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）				
									事業費		238					238				
315	伊左衛門橋	伊左衛門仲川原線	2.4	23	RC溝橋（BOXカルバート）	1978	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）				
									事業費		267					267				
316	下村橋	下村湯之片線	2.1	7.6	RC溝橋（BOXカルバート）	1977	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）			
									事業費			238					238			
317	東明田2号橋	東明田島崎線	2.3	6.4	RC溝橋（BOXカルバート）	1977	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）			
									事業費			238					238			
318	五節句橋	五節句請閑線	4.8	4.6	RC床版橋（その他）	1988	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）			
									事業費			232					232			
319	谷辺橋	谷辺内ヶ迫線	4.6	6.8	RC床版橋（その他）	1994	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）			
									事業費			238					238			
320	権現原橋	権現原上原線	2	5.1	RC溝橋（BOXカルバート）	1976	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）			
									事業費			232					232			
321	門田下2号橋	門田下古川線	2.5	12	RC溝橋（BOXカルバート）	1983	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）			
									事業費			260					260			
322	北鶴4号橋	北鶴逆江木線	2	3.8	RC床版橋（その他）	1993	2015	I	工種	委託（点検）						委託（点検）				
									事業費	310						227				
323	新町橋	新町1号線	2.1	8	RC溝橋（BOXカルバート）	1984	2015	I	工種	委託（点検）						委託（点検）				
									事業費	310						238				
324	樋ノ道1号橋	樋ノ道池田線	2.5	8.3	RC溝橋（BOXカルバート）	1984	2015	I	工種	委託（点検）						委託（点検）				
									事業費	310						238				
325	土ノ口橋	土ノ口蔵之向線	2.5	3.5	RC床版橋（その他）	1993	2015	I	工種	委託（点検）						委託（点検）				
									事業費	310						227				
326	御陵参拝道路橋	茶臼原西都原線	11.4	12.5	プレテン中空床版	2002	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）				
									事業費		310					310				
327	中山2号橋	中山小森線	7.2	4.6	RC床版橋（その他）	2002	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）			
									事業費			257					257			
328	岩井谷橋1	黒松元黒松線	19.5	5.2	H形鋼（非合成）	2006	2016	I	工種			委託（点検）					委託（点検）			
									事業費			259					259			
329	石原4号橋	西都インター側道1号線	16	5.2	プレテン床版	2001	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）			
									事業費			283					283			
330	古川側道橋	石原藤四郎窪線	15	5.2	プレテン床版	1998	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）			
									事業費			271					271			
331	下水流道路橋	茶臼原西都原線	4.5	13.5	RC溝橋（BOXカルバート）	2003	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）				
									事業費		283					283				
332	瀬口2号橋	瀬口鳥子線	3.5	13.5	RC溝橋（BOXカルバート）	1998	2015	I	工種	委託（点検）					委託（点検）					
									事業費	310					260					
333	桑原1号橋	桑原上園線	8.1	3.6	RC T桁	1997	2015	III	工種	委託（点検）					委託（点検）					
								対策済	事業費	310					256					
334	杉野橋	中ノ迫杉尾線	7.7	4	RC床版橋（その他）	2000	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）				
									事業費		235					235				
335	中河原橋	中島堀の内線	6.6	8.5	RC溝橋（BOXカルバート）	2017	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）			
									事業費			270					270			
336	小園1号橋	小園1号線	7.9	5.4	RC床版橋（その他）	2007	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）			
									事業費			257					257			

対策内容と実施時期および費用

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	※ 1 架 設 年	点 検 年	定期点検 結果	内 訳	事業費（千円）									
										対策内容・時期									
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
337	小園3号橋	小園国富町線	9.8	6.2	PC 床版橋その他	1996	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費			277					277		
338	石原水洗橋	石原水洗線	4.6	7	RC溝橋（BOXカルバート）	1998	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費			238					238		
339	無名橋1	上中市ヶ園線	2	6.9	RC溝橋（BOXカルバート）	2009	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費			238					238		
340	北鶴1号橋	北鶴堀ノ内線	7.3	3.6	プレテン床版	2017	2015	I	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費		310					256			
341	米丸1号橋	米丸石貫平ノ下線	6.2	3.5	RC床版橋（その他）	2006	2015	I	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費		310					235			
342	米丸2号橋	米丸上園線	10.3	6.2	RC溝橋（BOXカルバート）	2013	2015	I	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費		310					288			
343	勿田2号橋	勿田樋ノ道線	11.6	6.4	PC 床版橋その他	2013	2015	I	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費		400					355			
344	戸敷橋	戸敷線	117.9	6.7	PC桁橋（その他）	1985	2019	I	工種					委託（点検）					委託（点検）
									事業費						704				704
345	瀬戸畑2号橋	瀬戸畑彦七畑線	2	4.6	RC溝橋（BOXカルバート）	2009	2015	I	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費		310					232			
346	山ノ平橋	山ノ平2号線	4.4	3.1	RC床版橋（その他）	2002	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費			227				227			
347	赤野1号橋	赤野栗野線	2	6.5	RC溝橋（BOXカルバート）	2009	2015	I	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費		310					238			
348	瀬戸畑1号橋	瀬戸畑三反田線	2	3.4	RC溝橋（BOXカルバート）	2006	2015	I	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費		310					277			
349	鏡心畑2号橋	鏡心畑寺ノ下線	2.3	5	RC溝橋（BOXカルバート）	1999	2015	I	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費		310					232			
350	北鶴3号橋	北鶴島畑線	2.3	4.2	RC溝橋（BOXカルバート）	2014	2015	I	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費		310					232			
351	調殿9号橋	調殿千田線	4.2	3	RC床版橋（その他）	2001	2015	I	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費		310					227			
352	千田2号橋	城平園線	4.9	5.6	RC床版橋（その他）	1966	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費			232				232			
353	鳥子橋	瀬口鳥子線	17.6	7.1	I桁（非合成）	1994	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費			383				383			
354	中山1号橋	中山小森線	7.9	4.1	RC床版橋（その他）	1986	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費			257				257			
355	月中1号橋	井尻石野田線	5.1	8.1	RC T桁	1977	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費				277				277		
356	中子田3号橋	中子田諸熊線	14.5	8.5	プレテンT桁	1983	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費			356				356			
357	三納2号橋	三納線	8	6.5	RC床版橋（その他）	1984	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費				283				283		
358	岩井谷橋	三財都於郡線	14.2	5.8	プレテン床版	1980	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）		
									事業費				271				271		
359	三納1号橋	三納線	9.1	11.6	プレテン床版	1987	2015	I	工種	委託（点検）					委託（点検）				
									事業費		310					283			
360	原無田1号橋	原無田線	3.1	8	RC溝橋（BOXカルバート）	1979	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）			
									事業費			238				238			

対策内容と実施時期および費用

実施 順位	橋梁名	路線名称	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	※ 1 架 設 年	点 検 年	定期点検 結果	内 訳	事業費（千円）										
										対策内容・時期										
										2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
361	原無田3号橋	原無田線	2.1	8.4	RC溝橋（BOXカルバート）	1984	2016	I	工種		委託（点検）					委託（点検）				
									事業費		238					238				
362	川南2号橋	三財都於郡線	3.5	9.2	RC溝橋（BOXカルバート）	1985	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		238						238			
363	田中橋	下鶴田中線	24.6	14.8	プレテン床版	2015	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		397						397			
364	堀之内橋	山角矢生町線	6.3	8.5	RC溝橋（BOXカルバート）	2016	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		270						270			
365	藺田橋	筑後線	9.4	8.2	プレテン床版	1999	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		277						277			
366	小森橋	中山小森線	11.6	5.2	プレテン床版	1998	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		271						271			
367	一之迫橋	城平園線	4.6	10.6	RC溝橋（BOXカルバート）	2000	2016	I	工種		委託（点検）						委託（点検）			
									事業費		260						260			
368	公園橋	公園通線	2	23	RC溝橋（BOXカルバート）	1999	2017	I	工種			委託（点検）					委託（点検）			
									事業費		262						262			
369	町頭4号橋	町頭下水流線	2.8	11.9	RC溝橋（BOXカルバート）	2006	2015	I	工種	委託（点検）					委託（点検）					
									事業費	310					260					
370	下鶴5号橋	下鶴田中線	2	14.2	RC溝橋（BOXカルバート）	2012	2015	I	工種	委託（点検）					委託（点検）					
									事業費	310					268					
